

所属名	事務事業名	ページ番号
河川砂防課	河川水路の浚渫伐採事業	2
河川砂防課	河川・樋門等維持管理事業	3
河川砂防課	防災インフラ整備事業	4
河川砂防課	緊急浚渫推進事業	5
河川砂防課	川と親しむ事業	6
河川砂防課	地域環境用水確保事業	7
河川砂防課	佐賀コロニー跡地開発関連水路整備事業	8
河川砂防課	川上地区調整池整備事業	9
河川砂防課	準用河川地蔵川改修事業	10
河川砂防課	準用河川城東川整備事業	11
河川砂防課	新川上流改修事業	12
河川砂防課	準用河川奉賀川整備事業	13
河川砂防課	準用河川戊辰川改修事業	14
河川砂防課	急傾斜地崩壊防止事業	15

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	河川水路の浚渫伐採事業	事業期間	昭和 40 ~ 年度
担当部署・係名	河川砂防課 維持係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	治水対策等の充実	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	河川水路の排水機能を充実させるために定期的な浚渫・伐採を行い、アシ、ホテイアオイ、ヒシ、ナガエツルノゲイトウ等の水草除去を行う。				
事業の対象者	河川流域の市民				
令和4年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・特定外来生物巡回除去 ・水面維持管理（エリア1～12） ・樹木伐採（市内一円） ・除草（上碓川外） ・浚渫 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	99,216	121,710	111,536		
うち佐賀市の負担額	99,216	121,710	111,536		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
特定外来生物除去面積						m2
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
9,745	9,000 12,828	9,000 12,285	9,000	9,000		

Year	Target	Actual
R2	9,000	9,745
R3	9,000	12,828
R4	9,000	12,285
R5	9,000	
R6	9,000	

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

Year	Target	Actual
R2	0	0
R3	0	0
R4	0	0
R5	0	0
R6	0	0

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	特定外来生物の除去面積は目標を達成しているが、繁茂の範囲は増加傾向にある。



成果目標達成に向けた対応策等
「川を愛する週間」において、市民の方々に河川清掃を実施していただいているが、どうしても市民の手に負えない水路については、現地確認の上、地元自治会から要望書の提出を求め、優先順位を協議し、公平・適正に河川の浚渫伐採を実施する。

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	河川・樋門等維持管理事業	事業期間	昭和 40 ~ 年度
担当部署・係名	河川砂防課 維持係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	治水対策等の充実	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	大雨洪水時の河川の増水による危険箇所を把握し、護岸補修や調整池、排水ポンプ等の維持管理を行う。また、主要な樋門樋管については地域の水事情に詳しい地元の方に操作を委託し、大雨注意報・警報発令時に樋門等周辺の内外水位並びに河川の状況を判断して操作を行うことで、浸水軽減を図る。				
事業の対象者	河川流域の市民				
令和4年度主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・護岸補修、根固め、調整池、排水ポンプ、樋門樋管等の維持管理 ・樋門樋管の操作委託 				
決算の推移 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	126,191	112,119	102,232		
うち佐賀市の負担額	126,191	112,119	102,232		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
樋門樋管の操作箇所数						箇所
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
285	288 288	288 288	288	288		

成果指標②						単位
樋門操作人の人数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
192	197 197	197 200	197	197		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	樋門樋管の操作箇所数や操作人の人数は目標を達成しているが、激甚化する大雨における樋門操作人の負担が増加している。



成果目標達成に向けた対応策等
職員によるパトロールで危険箇所、流水阻害箇所の発見に努める。また、樋門操作人の高齢化による負担増加のため、操作方法を引き継ぎ、若い世代への交代を進める。

令和5年度 事務事業実績報告シート


事務事業名	防災インフラ整備事業	事業期間	令和 2 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	河川砂防課 維持係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	治水対策等の充実	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）と連携しつつ、地方単独事業として実施する防災インフラの整備を推進するため創設された「緊急自然災害防止対策事業債」を活用し、市内における災害の発生予防・拡大防止を図る。 事業期間：R3～R7 事業内容：R4 ポンプ等整備4か所、樋管等改修1か所及び測量設計業務1か所。				
事業の対象者	市民				
根拠法令等					
決算額の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業費総額	0	53,831	35,278		
うち佐賀市の負担額	0	53,831	35,278		


2 事業の活動実績

活動実績①					単位
整備箇所数（水路整備、ポンプ等整備、樋管等改修、水路内支障工作物撤去）					箇所
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	
-	19	6			

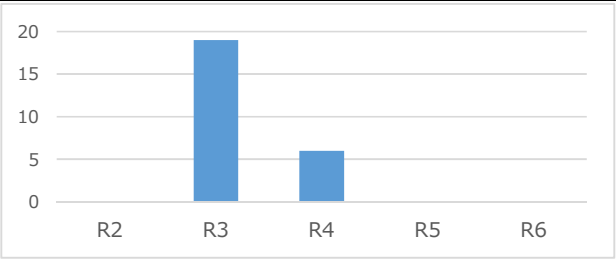

年度	実績
R2	0
R3	19
R4	6
R5	0
R6	0

活動実績②					単位
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	

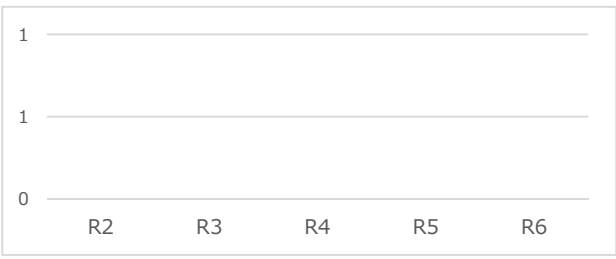

3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

R4年度は、R5.3月で完了。
 今後、緊急自然災害防止対策事業債を活用しながら、R7年度までの期間で計画的に実施していく。

令和5年度 事務事業実績報告シート


事務事業名	緊急浚渫推進事業	事業期間	令和 3 ~ 令和 6 年度
担当部署・係名	河川砂防課 維持係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	治水対策等の充実	

1 事務事業の基本情報


事業概要・目的	大雨時や洪水時に水路などの氾濫及び家屋等の浸水を未然に防ぐことを図るため、河道の支障となる樹木の伐採や堆積土の浚渫を行う。 事業期間：R3～R6 事業内容：R4 水路浚渫9か所				
事業の対象者	市民				
根拠法令等					
決算額の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業費総額	0	10,361	18,246		
うち佐賀市の負担額	0	10,361	18,246		

2 事業の活動実績

活動実績①					単位
堆積土の浚渫土量					m3
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	
-	648	1,025			

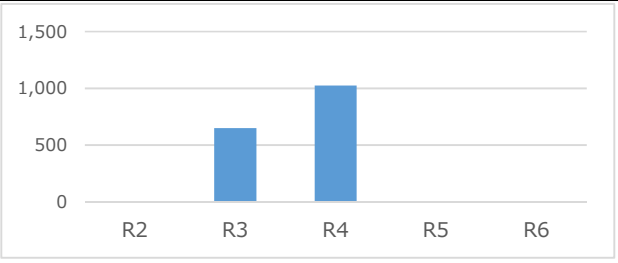

活動実績②					単位
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	

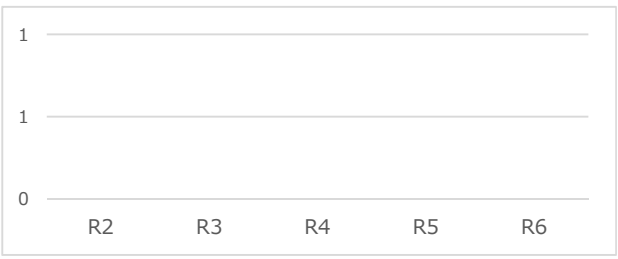

3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

R4年度は、R5.3月で完了。
河道の流下能力を確保するため、堆積土の状況を確認しながら計画を立て、浚渫を行っていく。

令和5年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	川と親しむ事業	事業期間	昭和 54 ~ 年度
担当部署・係名	河川砂防課 維持係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	水辺空間の保全	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	毎年、春と秋に「川を愛する週間」を設定し、自治会・事業所・学校等へ河川清掃の参加を呼び掛ける。市の役割分担として、清掃用具の貸出しや河川ゴミの回収を実施し、水辺環境の向上を図る。また、「川を愛する週間」に伴う河川浄化を目的に啓発を行う。				
事業の対象者	市民				
令和4年度主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・「川を愛する週間」の清掃用具の貸出及び河川ごみの収集運搬処分 ・市民で対応が難しい河川の要望対応 ・河川愛護ポスター、標語の優秀者への表彰 ・河川浄化功労者への表彰 				
決算の推移 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	109,424	119,243	123,611		
うち佐賀市の負担額	109,424	119,243	123,611		

2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
「川を愛する週間」における参加人数						人
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
53,817	90,000 79,463	90,000 84,935	90,000	90,000		

成果指標②						単位
安全で美しい河川環境の適切な管理						%
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
73.3	73.9 72.1	74.5 71.9	75.1	75.7		

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
③達成できていない	新型コロナウイルス感染症の影響で「川を愛する週間」における参加人数は目標に達成していないが、回復傾向にある。また、水辺への関心が若干薄れてきている。



成果目標達成に向けた対応策等
河川清掃参加者の高齢化や若年層の参加減少のため、市内小中学校や事業所等に参加要請を通知している。また、事業所等に直接訪問し、河川清掃への参加を要請したり、各自治会が河川浄化活動を維持するための取り組んでいる事例集を作成し配布することで、河川清掃参加者数の増加及び水辺環境の向上を図り、水辺に関心を持ってもらえるよう努める。

令和5年度 事務事業進捗報告シート


事務事業名	地域環境用水確保事業	事業期間	平成 12 ~ 年度
担当部署・係名	河川砂防課 水問題対策室	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	水辺空間の保全	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	佐賀市内に流れる水路の水量を確保することによって、水生生物が十分に生息できる環境を維持する。 また、併せて防火用水、修景・景観等の水量を確保し、市民と協力しながら水との共生都市の実現を目指す。				
事業の対象者	市内平野部を対象とした市民				
令和4年度 主な活動実績	<ul style="list-style-type: none"> ・多布施川水域における市街地水路の水量が相対的に減る非灌漑期（10月～3月）に、9地点で水質検査（BOD・COD・DO）を月1回ごとに実施（6回） ・市街地を流れる水路の水質及び水量を監視し、水辺空間の保全を図る。 				
決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	487	494	495		
うち佐賀市の負担額	487	494	495		


2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
水質検査・水量調査						回
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
54	54 54	54 54	27 27	27 27		

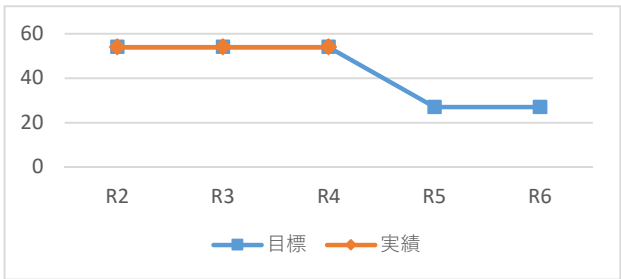

年度	目標	実績
R2	54	54
R3	54	54
R4	54	54
R5	27	27
R6	27	27

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		



年度	目標	実績
R2	0	0
R3	0	0
R4	0	0
R5	0	0
R6	0	0

3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
①達成している	定期的な水量の確認及び水質試験により市街地水路の水辺空間保全が図れた。 水質の急激な悪化が見られないことから、令和5年度より水質試験測定回数を27回とする。 (9地点×3回)



成果目標達成に向けた対応策等
<ul style="list-style-type: none"> ・市街地水路の水辺空間の保全のため、水質検査及び水量観測の実施による、水路の定期的な監視 ・多布施川沿川にあり、市街地水路の水量を調節している樋門の適正管理

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	佐賀コロニー跡地開発関連水路整備事業		事業期間	令和 3 ~ 令和 5 年度
担当部署・係名	北部建設事務所 事業係		担当課長名	中村 明弘
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実績できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀コロニー跡地の県営産業団地開発に伴い、周辺水路の整備を行う。 ・水路工L=350m				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R3年度	R4年度	R5年度	年度	年度
工事請負費		12,065			
測量・監理等委託料	7,647				
用地購入費		423			
補償費		97			
その他事務費等					
計	7,647	12,585			
うち佐賀市の負担	429	752			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					12,065
測量・監理等委託料					7,647
用地購入費					423
補償費					97
その他事務費等					
計					20,232
うち佐賀市の負担					1,181

2 事業の進捗率

R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	12.5% 9.1%	72.0% 24.8%	100.0%								

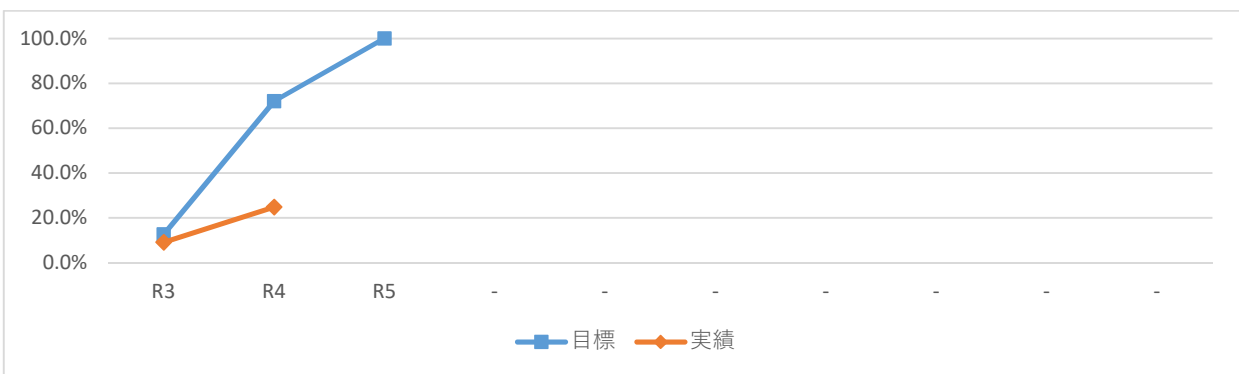

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	川上地区調整池整備事業		事業期間	令和 3 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	北部建設事務所 事業係		担当課長名	中村 明弘
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実績できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	大和町川上地区の浸水被害を軽減するため、大和中央公園に遊水池の整備を行う。 V=1,100m ³				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
工事請負費		30,083			
測量・監理等委託料	3,600	16,477			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	3,600	46,560			
うち佐賀市の負担		160			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					30,083
測量・監理等委託料					20,077
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					50,160
うち佐賀市の負担					160

2 事業の進捗率

R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	4.0% 0.7%	20.1% 10.1%	36.0%	68.0%	100.0%								

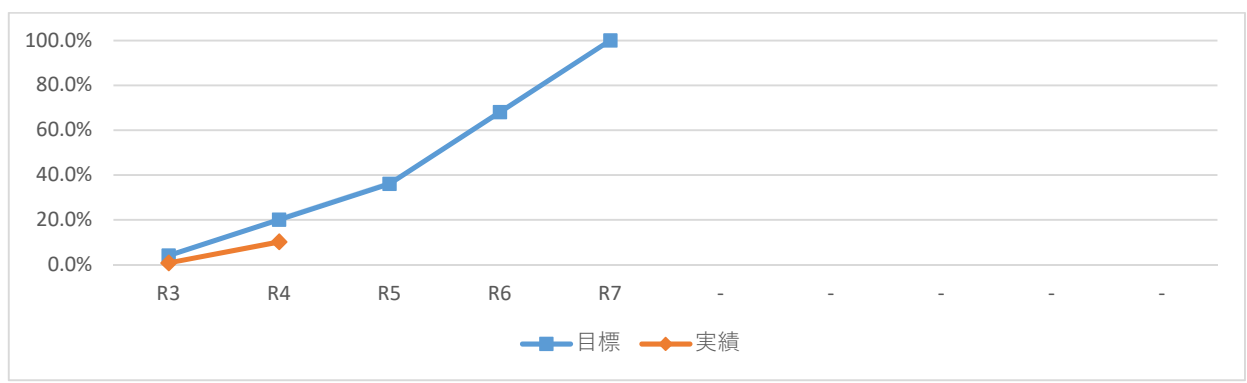

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	準用河川地蔵川改修事業		事業期間	平成 9 ~ 令和 6 年度
担当部署・係名	河川砂防課 事業係		担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	市街地西部の排水を担う準用河川地蔵川において排水機能強化のため河川改修工事を行う。 ・護岸工 L = 600m、幅 W = 8.8m、道路橋 6 基、サイフォン 2 基				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H9~H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
工事請負費	404,370	19,489	29,168	18,560	21,227
測量・監理等委託料	99,577	3,240		1,980	
用地購入費	281,160	755		14,890	894
補償費	178,068			48	46
その他事務費等	26,591				
計	989,766	23,484	29,168	35,478	22,167
うち佐賀市の負担	328,922	15,823	19,612	23,819	14,945
区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	合計
工事請負費	58,890	65,664			617,368
測量・監理等委託料		14,177			118,974
用地購入費					297,699
補償費		217			178,379
その他事務費等					26,591
計	58,890	80,058			1,239,011
うち佐賀市の負担	39,299	66,335			508,754

2 事業の進捗率

目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
70.0%	73.3%	76.7%	80.0%	83.3%	86.7%	90.0%	93.3%	96.7%	100.0%	
64.0%	66.0%	67.5%	69.5%	71.9%	73.3%	77.3%	82.6%			

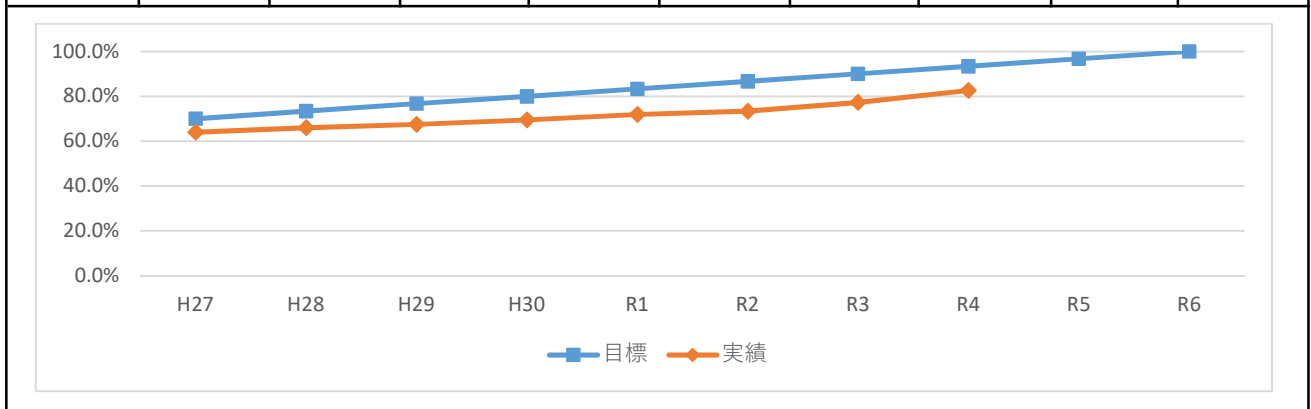

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	準用河川城東川整備事業		事業期間	平成 18 ~ 令和 8 年度
担当部署・係名	河川砂防課 事業係		担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	市街地東部の排水を担う準用河川城東川において排水機能強化のため河川改修工事を行う。 ・護岸工 L = 2,800m (うち狭窄部及び災害対策箇所)				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H18~H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
工事請負費	761,697		12,265	43,051	
測量・監理等委託料	296,987	2,571	12,220	218	6,209
用地購入費	516,655				
補償費	104,685	681	387		
その他事務費等	112				
計	1,680,136	3,252	24,872	43,269	6,209
うち佐賀市の負担	1,680,136	3,252	24,872	43,269	6,209
区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	合計
工事請負費					939,025
測量・監理等委託料					338,207
用地購入費					516,655
補償費					105,753
その他事務費等					112
計					1,899,752
うち佐賀市の負担					1,899,752

2 事業の進捗率

H29	目標 実績	H30	目標 実績	R1	目標 実績	R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績
	80.0%	85.0%	86.9%	88.8%	90.7%	92.5%	94.4%	96.3%	98.2%	100.0%									
	80.8%	88.4%	88.6%	89.9%	92.2%	92.4%													

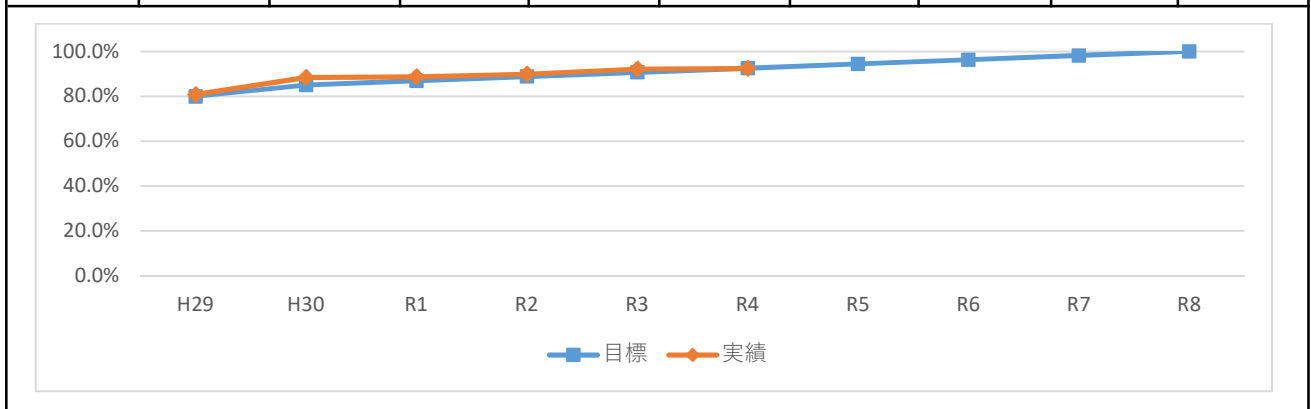

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	新川上流改修事業		事業期間	平成 26 ~ 令和 5 年度
担当部署・係名	河川砂防課 事業係		担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	県営土地改良事業鍋島東地区にあわせて、新川上流の排水機能強化のため河川改修工事を行う。 ・護岸工L=800m、函渠工1基				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H26~H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度
工事請負費	56,026		45,020	40,283	1,508
測量・監理等委託料	12,355	130	1,855		
用地購入費	2,305				1,023
補償費			1,565		48
その他事務費等					
計	70,686	130	48,440	40,283	2,579
うち佐賀市の負担	70,686	130	48,440	40,283	2,579
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	合計
工事請負費		1,247			144,084
測量・監理等委託料					14,340
用地購入費					3,328
補償費					1,613
その他事務費等					
計	0	1,247	0		163,365
うち佐賀市の負担		1,247			163,365

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R5
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	100.0%	
15.8%	41.9%	42.0%	70.7%	94.6%	96.1%	96.1%	97.0%	97.0%		

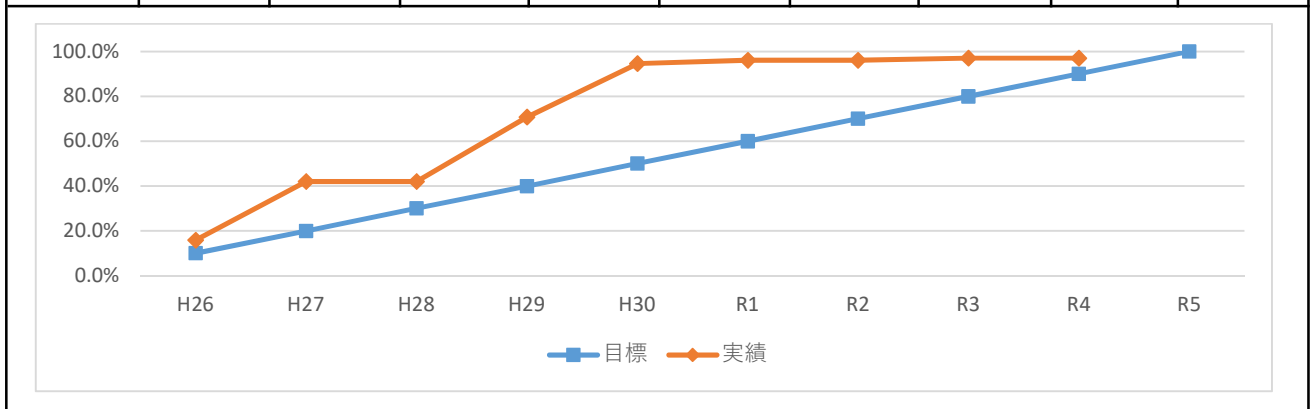

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	準用河川奉賀川整備事業		事業期間	令和 4 ~ 令和 4 年度
担当部署・係名	南部建設事務所 事業係		担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	準用河川奉賀川の護岸根固め及び法面の改修を行い、大雨や洪水時に河川護岸、道路の崩壊を防ぐ。 ・護岸根固め工 L=136m、法面保護 A=87㎡				
整備の目的	激甚化している大雨により頻発する浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R4年度	年度	年度	年度	年度
工事請負費	14,886				
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	14,886				
うち佐賀市の負担	86				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					14,886
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					14,886
うち佐賀市の負担					86

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
100.0%									
100.0%									

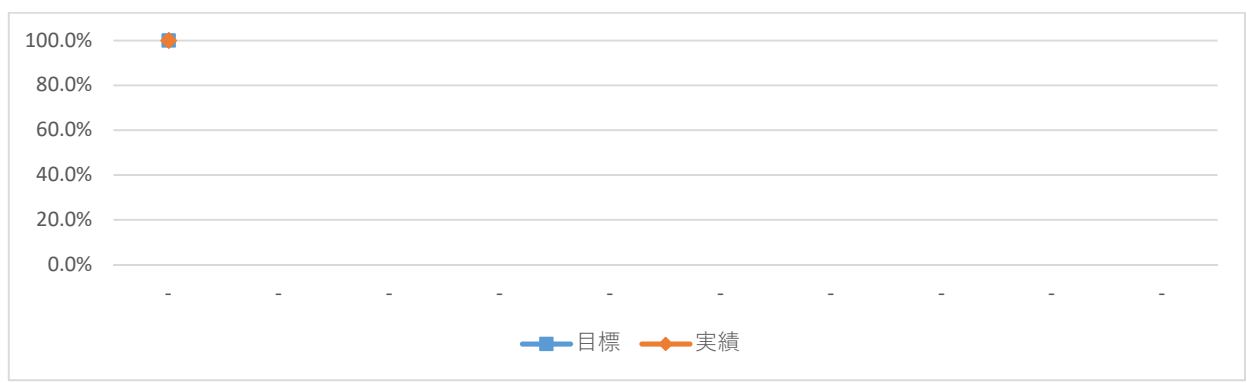

令和5年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	準用河川戊辰川改修事業		事業期間	令和 4 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	河川砂防課		担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理		
	基本事業	治水対策等の充実		

1 公共事業の基本情報

整備概要	護岸工（木柵） L=1,800m（両岸）				
整備の目的	準用河川戊辰川の排水機能強化のための整備を行い、流域の浸水被害の軽減を図る。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	15,684				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	15,684				
うち佐賀市の負担	15,684				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					15,684
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					15,684
うち佐賀市の負担					15,684

2 事業の進捗率

R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	5.0% 5.0%		37.0%		68.0%		100.0%				

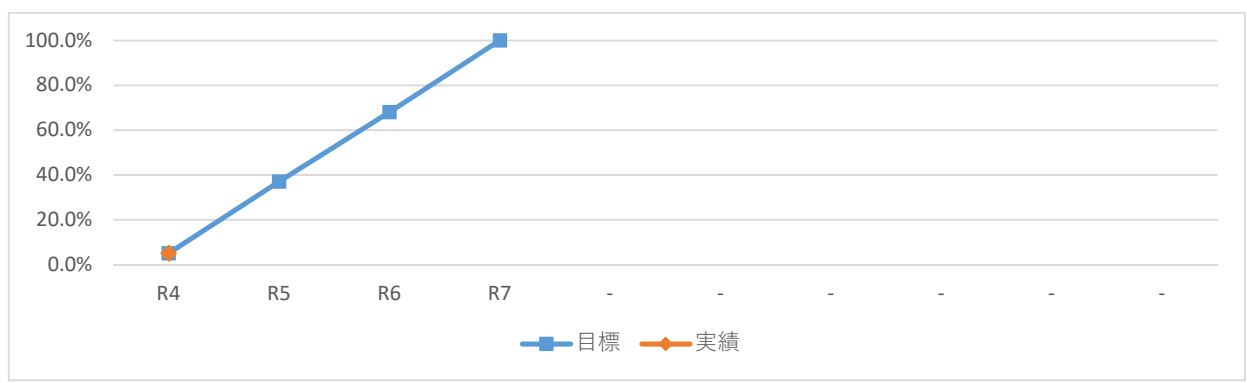

令和4年度 事務事業実績報告シート


事務事業名	急傾斜地崩壊防止事業	事業期間	平成 17 ~ 年度
担当部署・係名	河川砂防課 事業係	担当課長名	江口 弘行
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	08安全で美しい河川環境の適切な管理	
	基本事業	治水対策等の充実	

1 事務事業の基本情報


事業概要・目的	降雨や地震などに伴って発生するがけ崩れ災害に対し、急傾斜地崩壊防止施設等を設置することによって急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を守る。				
事業の対象者	急傾斜地の市民				
根拠法令等	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律				
決算額の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業費総額	88,779	63,761	66,796		
うち佐賀市の負担額	33,292	34,930	22,900		

2 事業の活動実績

活動実績①					単位
急傾斜地崩壊防止施設の設置					箇所
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	
18	9	7			

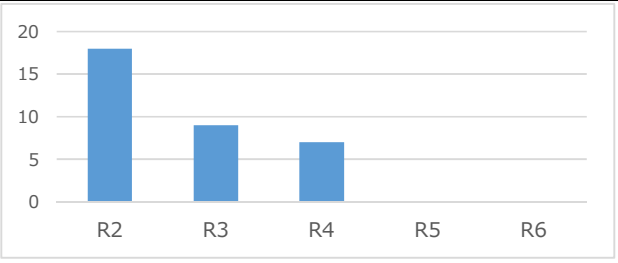

活動実績②					単位
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	

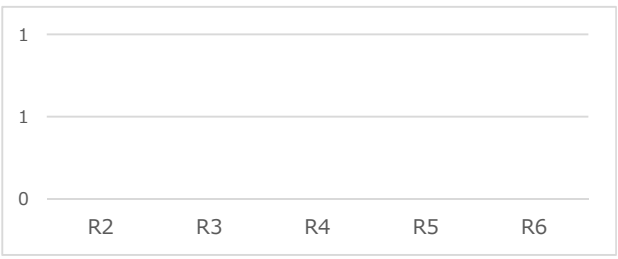

3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

急傾斜地の崩壊による災害から未然に人命を守るため、自然斜面で危険度が高く災害に直結する恐れのある箇所について、市民からの要望及び同意があれば擁壁工及び法面工等を実施する。
