

所属名	事務事業名	ページ番号
道路整備課	川副中央幹線道路整備事業	2
道路整備課	植木橋木角線道路整備事業	3
道路整備課	大財町北島線道路整備事業	4
道路整備課	上高木東湊線外1路線道路整備事業	5
道路整備課	栄町3号線道路整備事業	6
道路整備課	三溝線道路整備事業	7
道路整備課	通学路安全対策整備事業	8
道路整備課	佐賀コロニ-跡地開発関連道路整備事業	9
道路整備課	三溝線高質化整備事業	10
道路整備課	三溝線無電柱化整備事業	11
道路整備課	歴史的風致維持向上計画道路整備事業	12
道路整備課	新工業団地（東山田地区）関連道路整備事業	13
道路整備課	道路一般改良事業	14
道路整備課	佐賀県総合運動場周辺道路整備事業	15
道路整備課	合瀬赤田橋線道路整備事業	16
道路整備課	薙野大佐古線道路整備事業	17
道路整備課	私道等整備補助金交付事業	18
道路整備課	公立認定こども園アクセス道路整備事業	19
道路整備課	交通安全対策事業（道路整備課）	20
道路整備課	橋りょう長寿命化事業	21
道路整備課	八戸天祐線街路整備事業	22
道路整備課	東高木木角線街路整備事業	23
道路整備課	県営事業負担金	24

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	川副中央幹線道路整備事業	事業期間	平成 30 ~ 令和 6 年度
担当部署・係名	道路整備課 事業一係	担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	12道路ネットワークの充実	
	基本事業	基幹交通網の整備による円滑な移動の確保	

1 公共事業の基本情報

整備概要	川副中央幹線を有明海沿岸道路へのアクセス道路として整備を行う ・延長L = 3,100m、幅員W = 15.0m（車道幅員8.0m、歩道幅員3.5m×2）				
整備の目的	有明海沿岸道路川副 I C（仮称）からの交通の円滑化、交流圏の拡大や物流の効率化と交通渋滞の緩和、歩道整備による歩行者等の安全・安心な通行の確保				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	10,800	59,411	150,653		
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	10,800	59,411	150,653		
うち佐賀市の負担	460	2,635	6,894		
区分	R5年度	R6年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					220,864
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					220,864
うち佐賀市の負担					9,989

2 事業の進捗率

H30	目標	実績	R1	目標	実績	R2	目標	実績	R3	目標	実績	R4	目標	実績	R5	目標	実績	R6	目標	実績
	0.9%	0.2%	4.8%	1.5%	10.9%	4.8%	11.6%	22.7%	65.6%	100.0%										

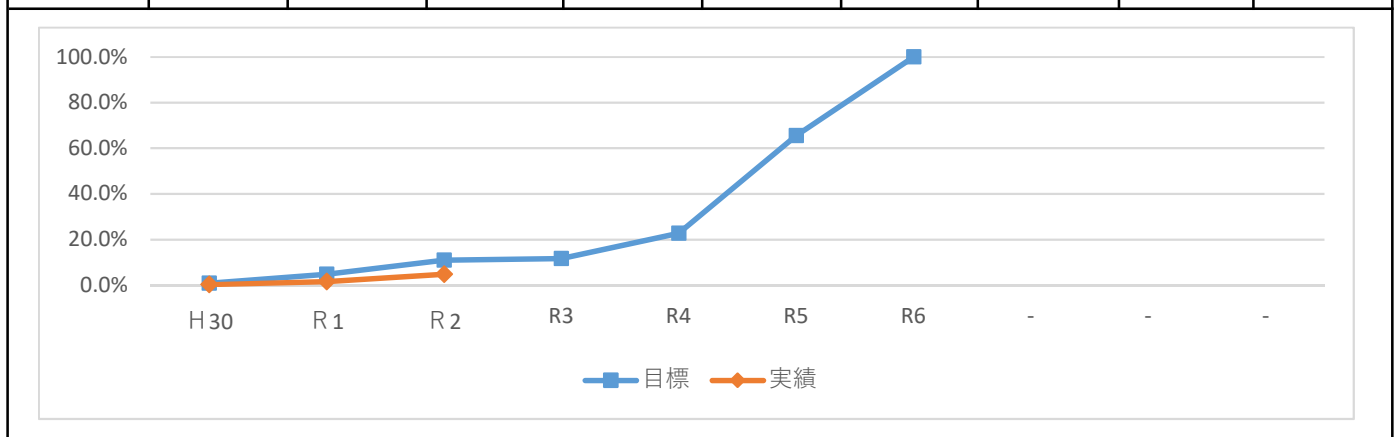

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	植木橋木角線道路整備事業		事業期間	平成 25 ~ 令和 6 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	植木橋木角線の道路新設を行う ・延長L=940m、幅員W=12.0m、(車道幅員7.0m、歩道幅員2.5m×2)				
整備の目的	児童生徒をはじめ住民の通行の安全と円滑な車両通行の確保				
事業費決算(単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
工事請負費		4,590	25,000	37,403	43,220
測量・監理等委託料	23,382	42,583	13,249	523	1,501
用地購入費		22,386	25,399		16,580
補償費		17,471	13,621	45,564	77,174
その他事務費等			10	414	10
計	23,382	87,030	77,279	83,904	138,485
うち佐賀市の負担	522	2,101	1,306	2,273	2,405
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計
工事請負費	22,093	20,287	49,759		202,352
測量・監理等委託料	3,553	4,700	2,255		91,746
用地購入費	5,727				70,092
補償費	28,451	3,029	904		186,214
その他事務費等	113	325	356		1,228
計	59,937	28,341	53,274		551,632
うち佐賀市の負担	1,509	877	1,552		12,545

2 事業の進捗率

目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
H27 22.8%	H28 33.8%	H29 43.8%	H30 50.8%	R1 55.9%	R2 70.0%	R3 75.0%	R4 84.0%	R5 92.0%	R6 100.0%	
18.8%	27.2%	41.0%	47.0%	49.8%	55.2%					

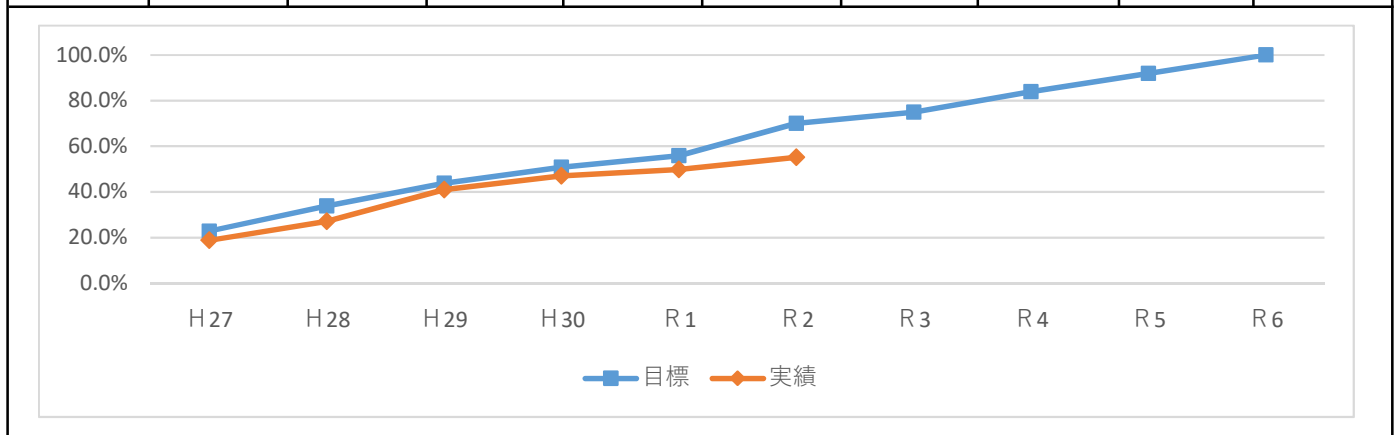

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	大財町北島線道路整備事業		事業期間	平成 25 ~ 令和 4 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	大財町北島線の車道を嵩上げし、セミフラット方式の歩道整備を行い、自転車及び歩行者の走行空間の再設置・延長L = 1,790m、幅員W = 16.0m、（車道幅員7.0m、歩道幅員4.5m×2）				
整備の目的	乗入口における段差解消をするとともに、歩道を広げて自転車と歩行者の通行を歩道内で分離し、バリアフリー及び道路交通の安全性の向上				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
工事請負費			52,994	63,858	95,393
測量・監理等委託料	5,000	12,442			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等			875	364	382
計	5,000	12,442	53,869	64,222	95,775
うち佐賀市の負担	150	642	1,429	1,940	1,973
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計
工事請負費	119,510	82,226	83,994		497,975
測量・監理等委託料					17,442
用地購入費					
補償費					
その他事務費等	317	611	478		3,027
計	119,827	82,837	84,472		518,444
うち佐賀市の負担	2,737	2,073	2,754		13,698

2 事業の進捗率

目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	目標	実績
0.7%	7.9%	16.4%	29.7%	49.4%	61.4%	73.3%	88.7%	95.9%	100.0%		
0.7%	2.6%	10.6%	20.1%	34.3%	52.0%	64.3%	76.8%				

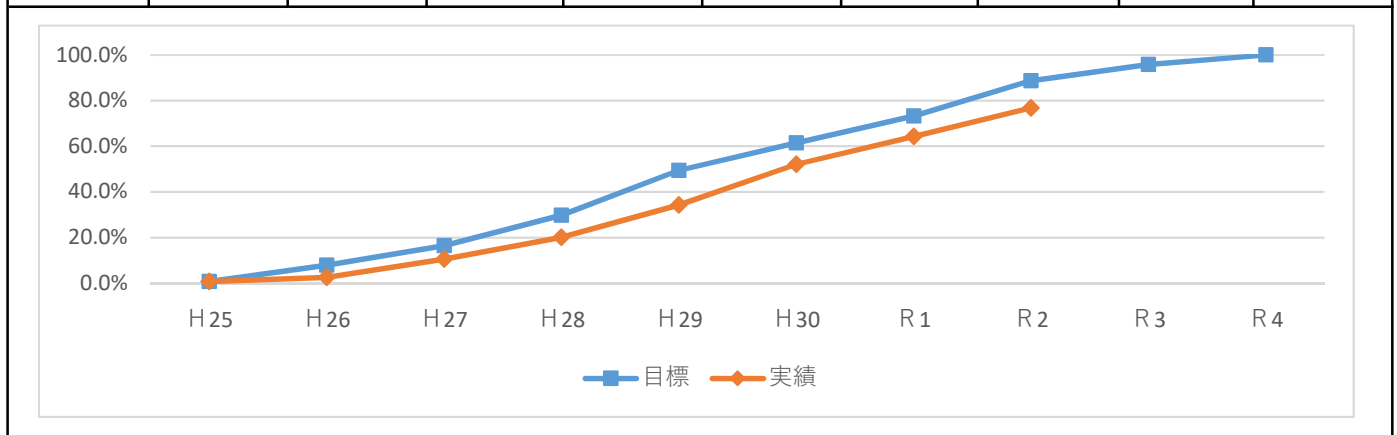

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	上高木東淵線外1路線道路整備事業		事業期間	平成 29 ~ 令和 5 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	基幹交通網の整備による円滑な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	市道上高木東淵線の改良及び市道長瀬東高木線の道路新設を行う ・上高木東淵線 延長L=190m、幅員W=13.0m（車道幅員8.0m、歩道幅員2.5m×2） ・長瀬東高木線 延長L=1,300m、幅員W=12.5m（車道幅員7.5m、歩道幅員2.5m×2）				
整備の目的	児童生徒をはじめ住民の通行安全と円滑な車両通行の確保				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度
工事請負費			42,299	31,317	
測量・監理等委託料	5,570	35,227	25,703		
用地購入費				13,870	
補償費			4,006	80,920	
その他事務費等					
計	5,570	35,227	72,008	126,107	
うち佐賀市の負担	207	992	8,123	3,253	
区分	R4年度	R5年度	年度	年度	合計
工事請負費					73,616
測量・監理等委託料					66,500
用地購入費					13,870
補償費					84,926
その他事務費等					
計					238,912
うち佐賀市の負担					12,575

2 事業の進捗率

H29	目標	H30	目標	R1	目標	R2	目標	R3	目標	R4	目標	R5	目標	目標	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績	実績	実績	実績
	0.7%		5.2%		14.5%		38.5%		57.1%		71.2%		100.0%			
	0.7%		5.2%		14.5%		30.6%									

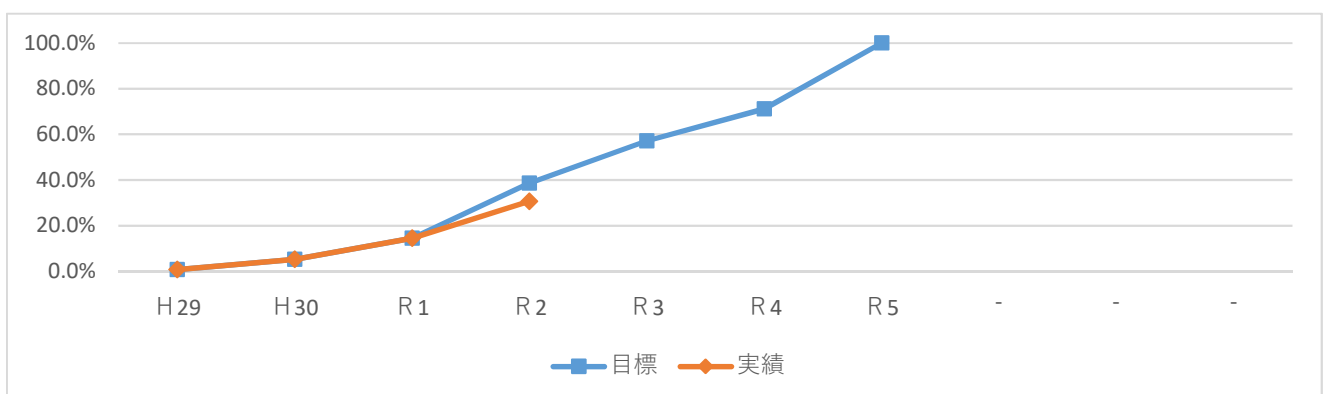

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	栄町3号線道路整備事業		事業期間	平成 30 ~ 令和 3 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	本市が定める「佐賀市自転車利用環境整備計画」のネットワーク路線の整備を行う ・延長L = 310m、幅員W = 12.0m、（車道幅員7.0m、歩道幅員2.0m、3.0m）				
整備の目的	自転車走行環境の改善を図り、通行者の安全と円滑な車両通行の確保				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	年度
工事請負費		15,600	43,420		
測量・監理等委託料	5,297				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	5,297	15,600	43,420		
うち佐賀市の負担	284	392	1,166		
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					59,020
測量・監理等委託料					5,297
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					64,317
うち佐賀市の負担					1,842

2 事業の進捗率

H30	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	6.1% 6.1%	54.2% 23.9%	77.1% 73.7%	100.0%							

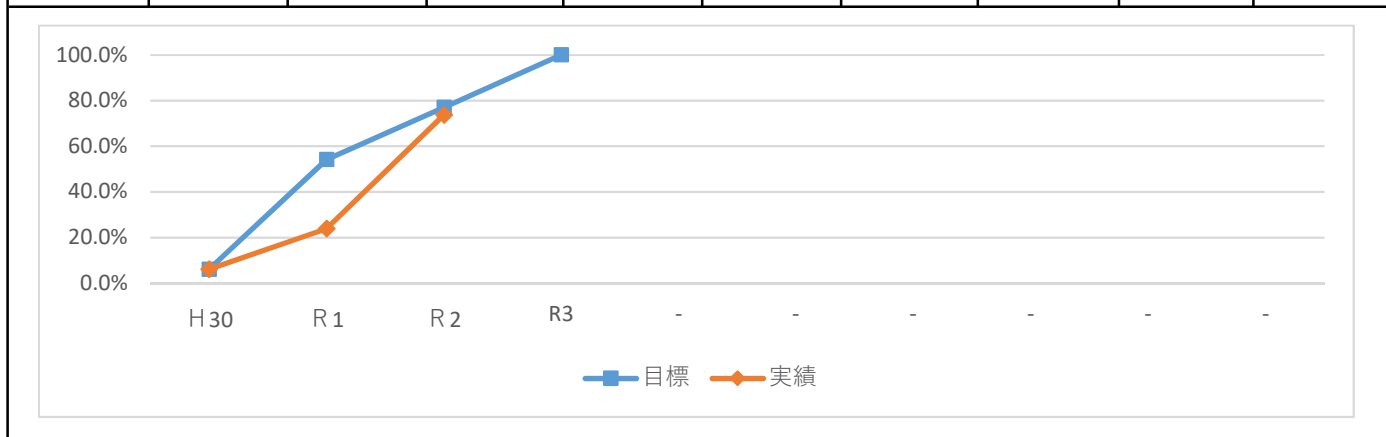

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	三溝線道路整備事業		事業期間	令和 1 ~ 令和 7 年度
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	12道路ネットワークの充実		
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保		

1 公共事業の基本情報

整備概要	駅への主要なアクセス道路及びSAGAサンライズパークエリアへのアクセス道路としての整備を行う ・延長L=900m、幅員W=20.0m、(車道幅員11.0m、歩道幅員9.0m)				
整備の目的	歩行者と自転車を分離し、歩行空間の充実を図ることによる歩行者の円滑な誘導の確保と、歩行者、自転車、自動車が安全・快適に通行できる環境の創出				
<b>事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
工事請負費		72,139			
測量・監理等委託料	19,189	873			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	19,189	73,012			
うち佐賀市の負担	435	2,355			
区分	R6年度	R7年度	年度	年度	合計
工事請負費					72,139
測量・監理等委託料					20,062
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					92,201
うち佐賀市の負担					2,790

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7				
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
14.2%	43.1%	53.6%	64.7%	75.8%	77.8%	100.0%				
4.3%	20.5%									

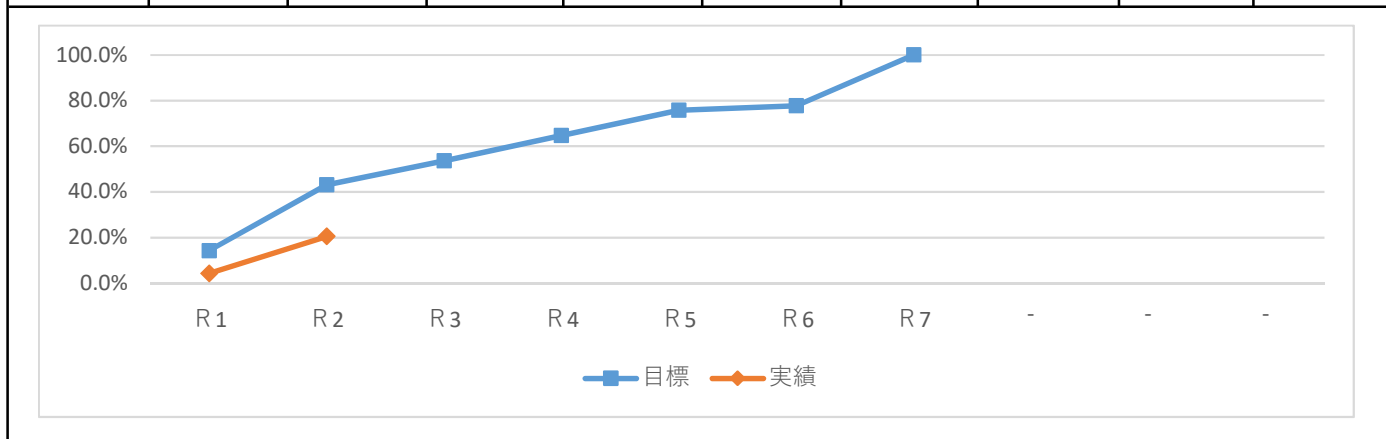

## 令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	通学路安全対策整備事業		事業期間	平成 30 ~ 令和 6 年度
担当部署・係名	道路整備課 事業二係		担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	12道路ネットワークの充実		
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保		

### 1 公共事業の基本情報

整備概要	①大井樋緑ヶ丘線：延長L=35m、幅員7.5m（車道5m、歩道2.5m）の歩道設置を行う。 ②総合運動場高木線：延長L=230m、幅員7.5m（車道5m、歩道2.5m）の歩道設置を行う。				
整備の目的	児童の安心・安全な通学路の確保				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	7,719		4,972		
用地購入費	2,703				
補償費		1,356			
その他事務費等					
計	10,422	1,356	4,972		
うち佐賀市の負担	4,690	610	2,237		
区分	R5年度	R6年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					12,691
用地購入費					2,703
補償費					1,356
その他事務費等					
計					16,750
うち佐賀市の負担					7,537

### 2 事業の進捗率

H30	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	5.5%	8.8%	8.8%	19.2%	84.8%	98.3%	100.0%						
	5.5%	6.2%	8.8%										

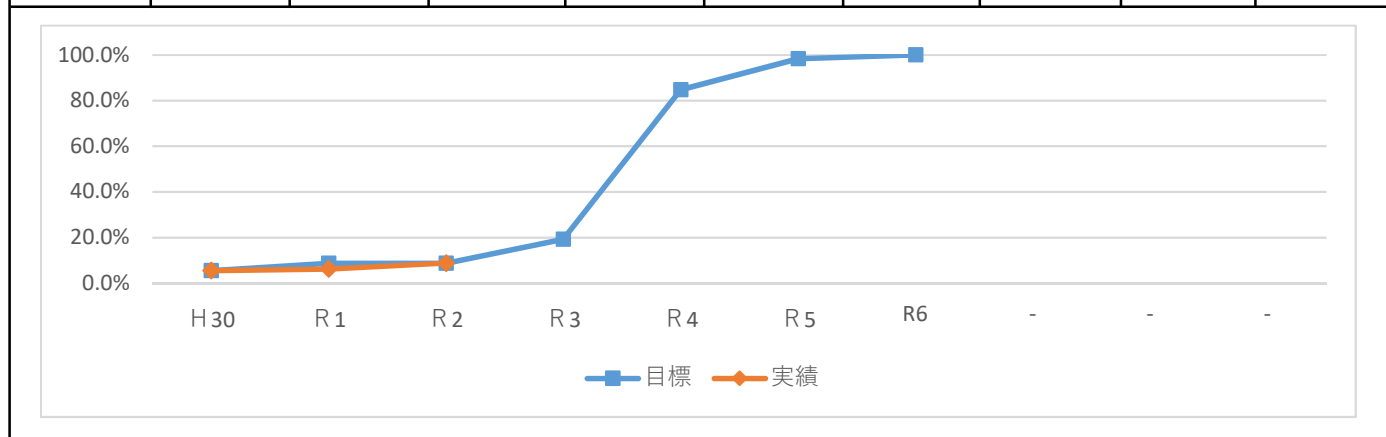



令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	佐賀コロニー跡地開発関連道路整備事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 5 年度	
担当部署・係名	北部建設事務所 事業係		担当課長名	小池 康雄	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀コロニー跡地と主要地方道佐賀外環状線を結ぶ路線の整備を行う ・延長L=310m、幅員W=10.5m、(車道幅員7.0m、歩道幅員3.5m)				
整備の目的	車道拡幅及び歩道の新設により、車両交通の円滑化と歩行者の安全性向上を図る				
<b>事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0				
うち佐賀市の負担					
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					
うち佐賀市の負担					

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
R2	R3	R4	R5							
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
6.0%	14.0%	51.0%	100.0%							
0%										

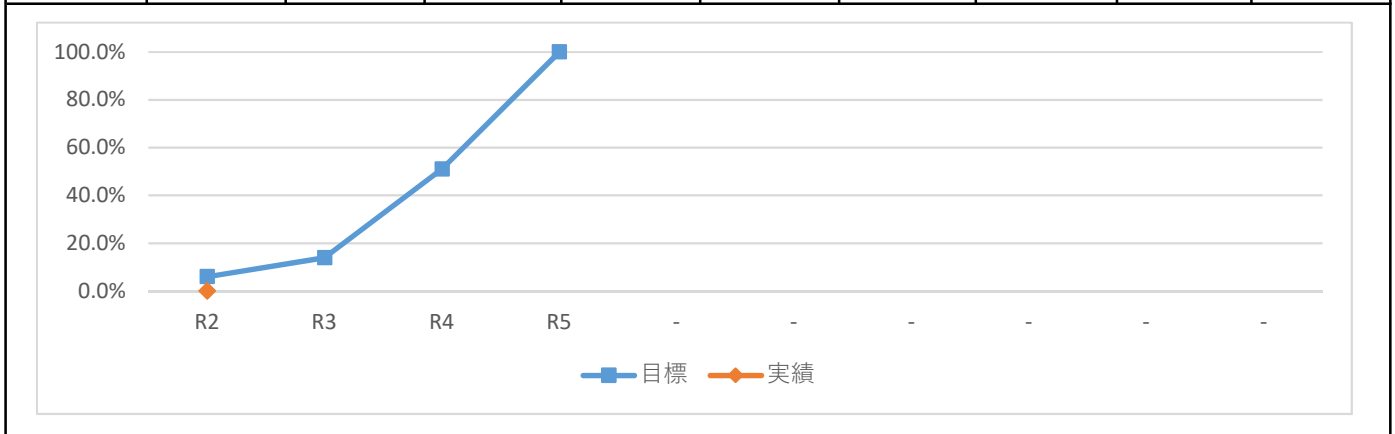

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	三溝線高質化整備事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 5 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	三溝線道路整備事業と併せて、歩道部分のカラー舗装化、ベンチ、花壇、照明灯の整備を行う ・延長L = 900m、歩道幅員W = 9.0m				
整備の目的	2024開催予定の国スポ等のメイン会場へ誘導する、安全で楽しく歩ける空間を創出する				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0				
うち佐賀市の負担					
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					
うち佐賀市の負担					

2 事業の進捗率

目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
R2		R3		R4		R5					
35.0%	0%	45.2%		72.6%		100.0%					

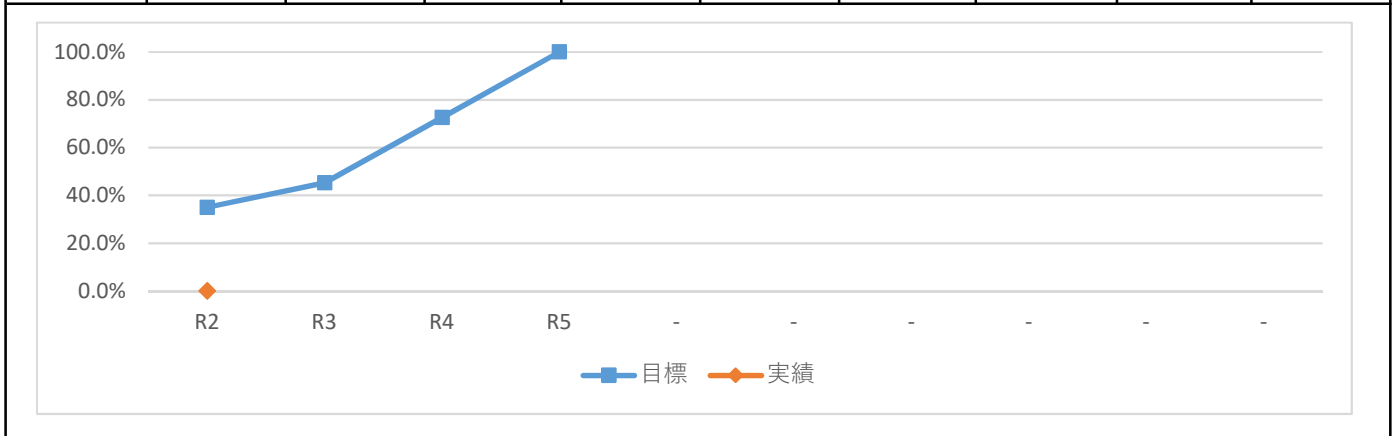

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	三溝線無電柱化整備事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 7 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業一係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	三溝線道路整備事業と併せて、無電柱化の整備を行う ・延長 L = 640m				
整備の目的	災害に強く、良好な景観を有する駅北口方面の新たなシンボルロードの創出を目指す				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0				
うち佐賀市の負担					
区分	R7年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					
うち佐賀市の負担					

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
R2	R3	R4	R5	R6	R7					
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
3.3%	22.9%	51.7%	71.0%	75.8%	100.0%					
0%										

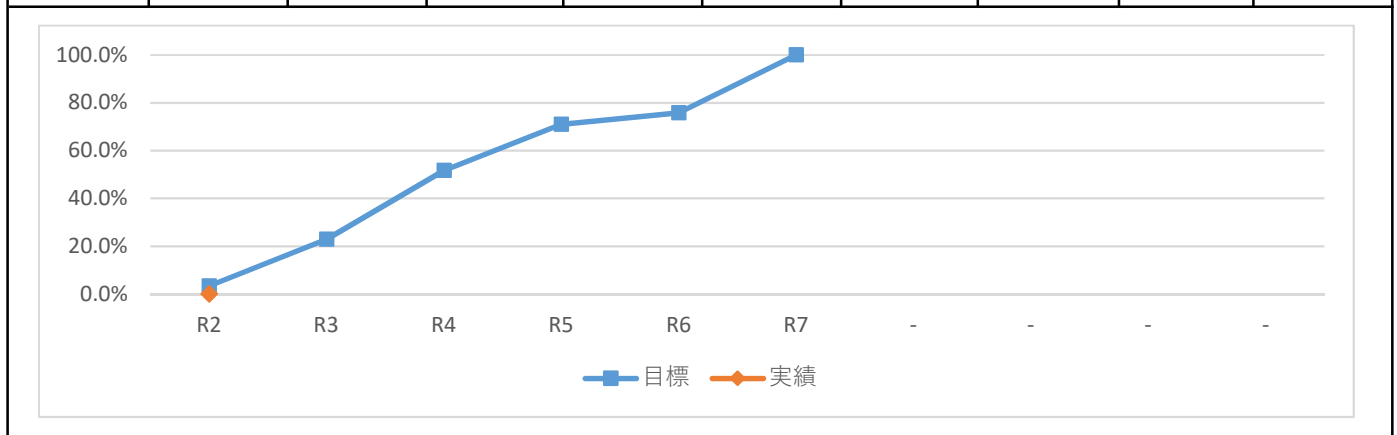

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	歴史的風致維持向上計画道路整備事業		事業期間	平成 26 ~ 令和 3 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業二係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	ふるさとに愛着と誇りを持ち、魅力ある人と文化を育むまち			
	施策	28未来につなげる文化の振興			
	基本事業	歴史遺産等の保存・継承と整備・活用			

1 公共事業の基本情報

整備概要	「佐賀市歴史的風致維持向上計画」に基づく、長崎街道等の舗装の高質化および排水機能の回復				
整備の目的	歴史的・文化的資産を活かし、歴史的なまちなみを後世に継承する。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
工事請負費		20,627	56,002	78,844	70,406
測量・監理等委託料	11,016				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	11,016	20,627	56,002	78,844	70,406
うち佐賀市の負担	308	1,127	1,390	1,944	1,682
区分	R1年度	R2年度	R3年度	年度	合計
工事請負費	30,958	59,945			316,782
測量・監理等委託料		1,600			12,616
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	30,958	61,545			329,398
うち佐賀市の負担	878	2,373			9,702

2 事業の進捗率

目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
H26 14.3%	H27 27.7%	H28 40.4%	H29 48.6%	H30 64.2%	R1 75.5%	R2 88.5%	R3 100.0%			
2.6%	7.4%	20.4%	38.8%	55.1%	62.3%	76.7%				

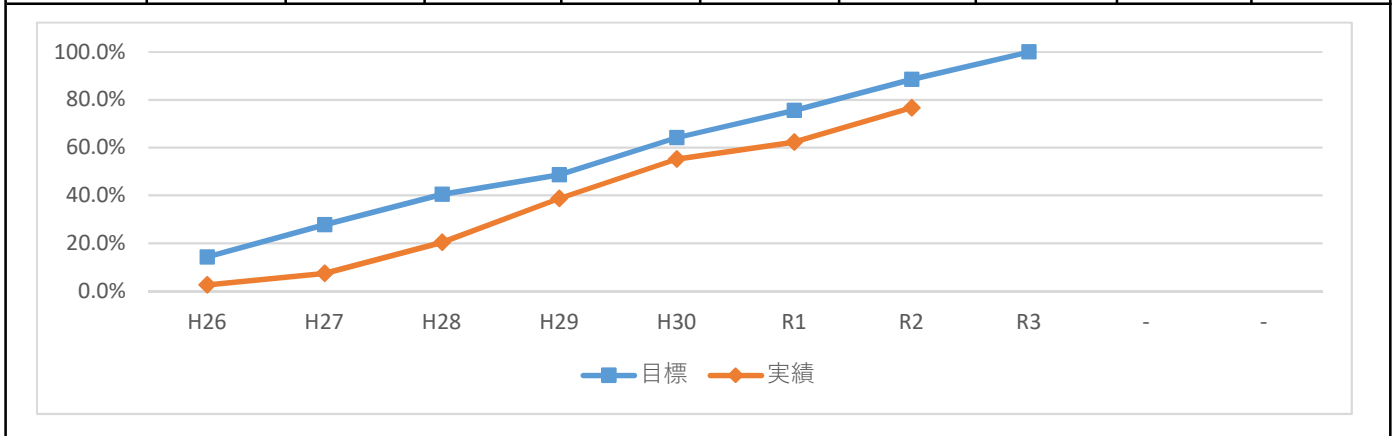

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	新工業団地（東山田地区）関連道路整備事業	事業期間	令和 1 ~ 令和 3 年度
担当部署・係名	道路整備課 事業一係	担当課長名	嘉村 浩二
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	12道路ネットワークの充実	
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保	

1 公共事業の基本情報

整備概要	大和町東山田地区に整備予定の工業団地に関連する敷地内の市道整備を行う ・延長L = 495m、幅員W = 9.75m、（車道幅員7.25m、歩道幅員2.5m）				
整備の目的	車道及び歩道の新設により、車両交通の円滑化と歩行者の安全性向上を図る				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	年度	年度
工事請負費		22,062			
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0	22,062			
うち佐賀市の負担		1,757			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					22,062
測量・監理等委託料					
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					22,062
うち佐賀市の負担					1,757

2 事業の進捗率

R1	目標 実績	R2	目標 実績	R3	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	78% 0%	78.0% 16.5%	100.0%								

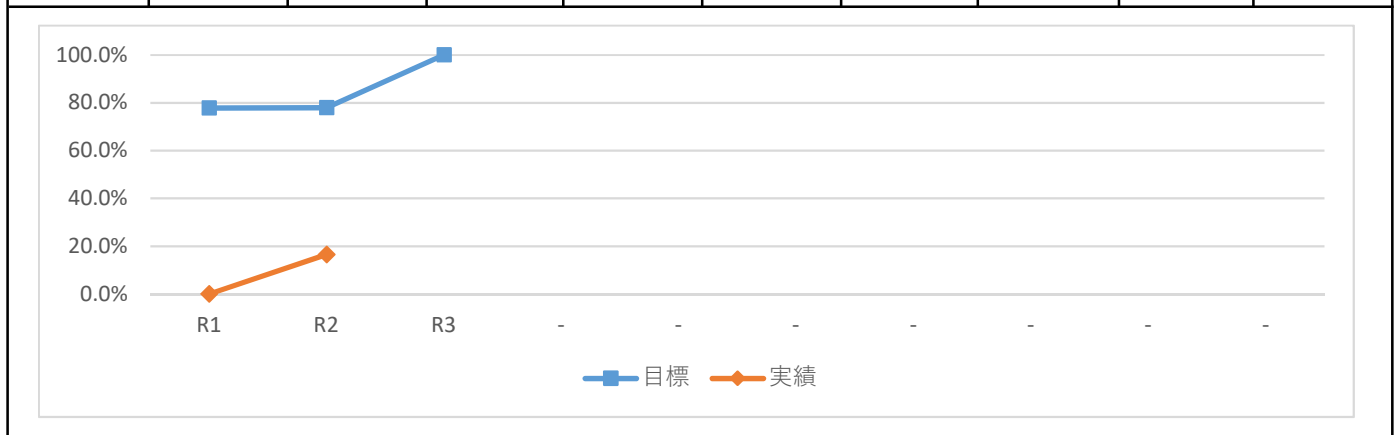

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	道路一般改良事業		事業期間	令和 1 ~ 令和 5 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業二係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	市道に対する市民の意向調査に基づき、五か年計画にて、機能回復や改善のための道路改良等を行う。				
整備の目的	快適で、安心・安全な生活道路の機能維持・向上				
<b>事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
工事請負費	126,501	137,595			
測量・監理等委託料	14,982	30,948			
用地購入費	3,202	343			
補償費	8,263	11,462			
その他事務費等	57	4			
計	153,005	180,352			
うち佐賀市の負担	153,005	177,259			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					264,096
測量・監理等委託料					45,930
用地購入費					3,545
補償費					19,725
その他事務費等					61
計					333,357
うち佐賀市の負担					330,264

2 事業の進捗率

R1	目標 実績	R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	20.3% 17.2%		39.7% 37.4%		57.2%		78.6%		100.0%					

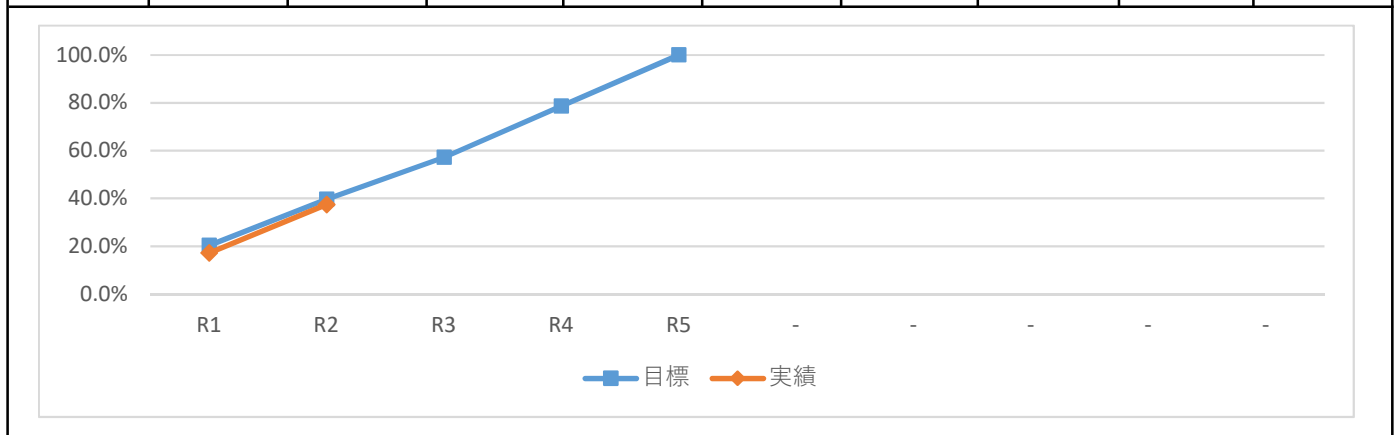

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	佐賀県総合運動場周辺道路整備事業		事業期間	令和 1 ~ 令和 4 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業二係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀県総合運動場に隣接する市道の拡幅および歩道の設置 延長L=130m、幅員9m（車道6.5m、歩道w=2.5m）				
整備の目的	総合運動場周辺における、安全で快適な生活道路の確保				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	年度
工事請負費		12,082			
測量・監理等委託料		3,385			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0	15,467			
うち佐賀市の負担		2,167			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					12,082
測量・監理等委託料					3,385
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					15,467
うち佐賀市の負担					2,167

2 事業の進捗率

目標 R1 実績	目標 R2 実績	目標 R3 実績	目標 R4 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
49.1%	49.1%	86.7%	100.0%							
0%	48.9%									

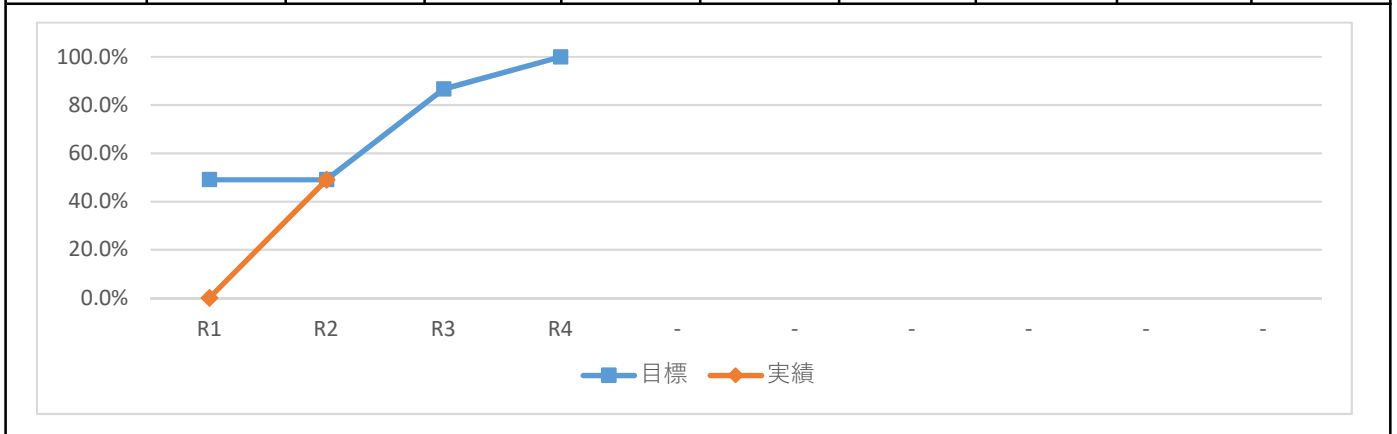

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	合瀬赤田橋線道路整備事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 2 年度
担当部署・係名	北部建設事務所 事業係		担当課長名	小池 康雄
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	12道路ネットワークの充実		
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保		

1 公共事業の基本情報

整備概要	過疎法に基づく市計画の過疎対策の道路整備事業であり、平成28年度から令和2年度までの5か年で整備を行うものである。 ・延長L=212m、幅員W=4.0m、(車道幅員4.0m)				
整備の目的	周辺住民の通勤・通学の安全性の向上を図るとともに、集落間のアクセス機能の向上による福祉・産業面での連携強化を高める。				
<b>事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
工事請負費		3,490	12,192	26,902	16,494
測量・監理等委託料	3,669	983			
用地購入費		1,689			
補償費		480	1,291		
その他事務費等		210	78	363	297
計	3,669	6,852	13,561	27,265	16,791
うち佐賀市の負担	69	52	61	65	91
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					59,078
測量・監理等委託料					4,652
用地購入費					1,689
補償費					1,771
その他事務費等					948
計					68,138
うち佐賀市の負担					338

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
H28	H29	H30	R1	R2						
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
7.0%	26.0%	55.0%	83.0%	100.0%						
5.0%	14.0%	33.0%	72.0%	100.0%						

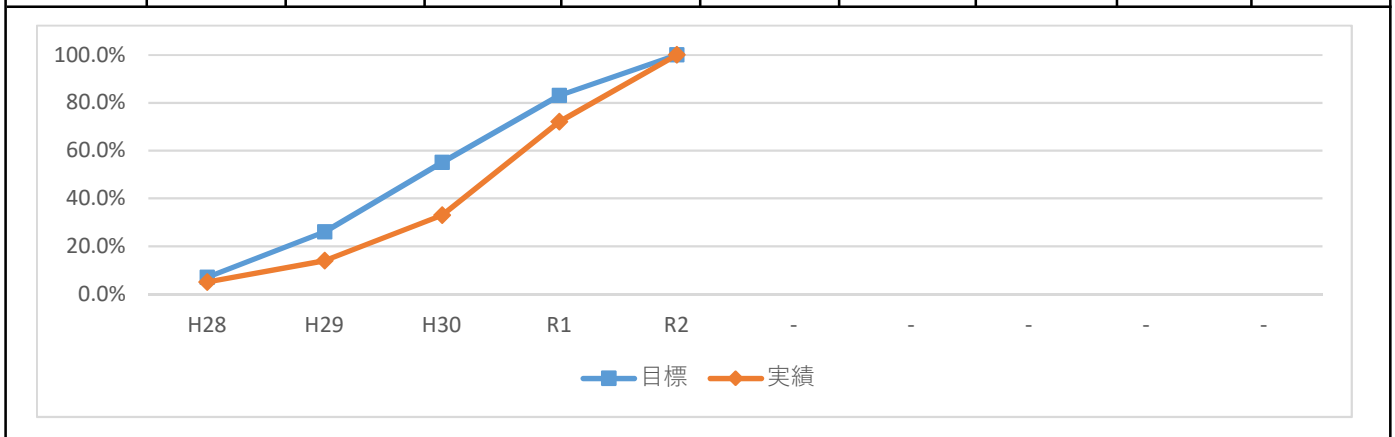



令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	薮野大佐古線道路整備事業		事業期間	平成 28 ~ 令和 3 年度	
担当部署・係名	北部建設事務所 事業係		担当課長名	小池 康雄	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	過疎法に基づく市計画の過疎対策の道路整備事業であり、平成28年度から令和2年度までの5か年で整備を行うものである。 ・延長L=790.0m、幅員W=4.0m、(車道幅員4.0m)				
整備の目的	周辺住民の通勤・通学の安全性の向上を図るとともに、集落間のアクセス機能の向上による福祉・産業面での連携強化を高める。				
<b>事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない</b>					
区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
工事請負費			18,000	40,974	70,486
測量・監理等委託料	4,800	15,044			
用地購入費		1,179	5,058	267	
補償費			2,012	26	
その他事務費等			652	1,066	998
計	4,800	16,223	25,722	42,333	71,484
うち佐賀市の負担	0	13	22	133	84
区分	R3年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					129,460
測量・監理等委託料					19,844
用地購入費					6,504
補償費					2,038
その他事務費等					2,716
計					160,562
うち佐賀市の負担					252

2 事業の進捗率

H28	目標	H29	目標	H30	目標	R1	目標	R2	目標	R3	目標	目標	目標	目標	目標
	実績		実績		実績		実績		実績		実績				
	7.0%		8.0%		36.0%		64.0%		100.0%						
	2.0%		10.0%		22.0%		41.0%		75.0%						

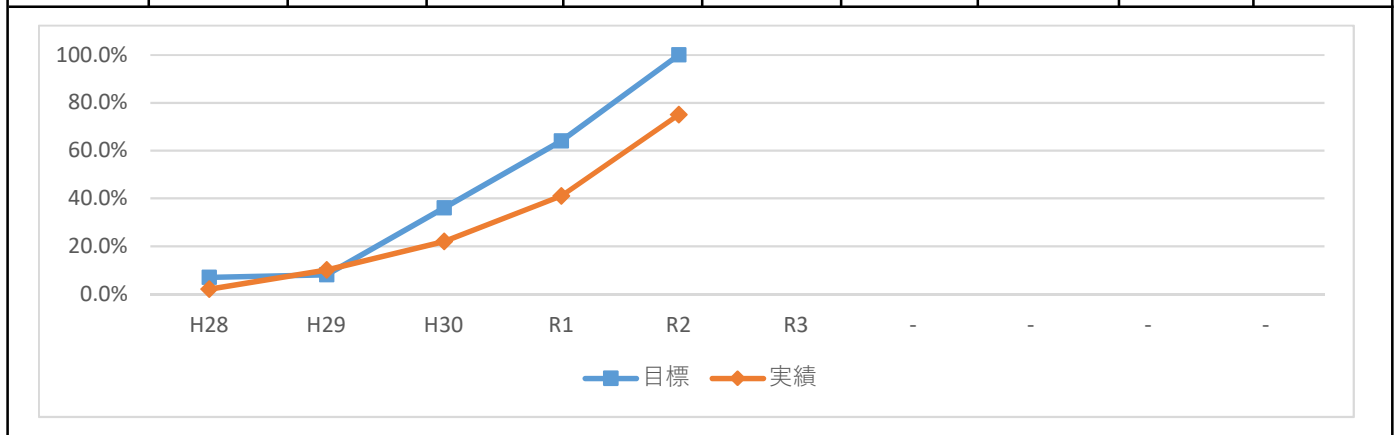

# 令和3年度 事務事業進捗報告シート

<b>事務事業名</b>	私道等整備補助金交付事業	<b>事業期間</b>	昭和 58 ~ 年度
<b>担当部署・係名</b>	道路整備課 事業二係	<b>担当課長名</b>	嘉村 浩二
<b>総合計画における位置づけ</b>	<b>政策</b>	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	<b>施策</b>	12道路ネットワークの充実	
	<b>基本事業</b>	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保	

## 1 事務事業の基本情報

<b>事業概要・目的</b>	「佐賀市私道等整備補助金交付規則」に基づき、市道として認定することが困難な私道等の整備を行うものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 私道等の生活環境の向上および交通安全に資することを目的とする。
<b>事業の対象者</b>	私道等の所有者
<b>令和2年度主な活動実績</b>	令和2年度 申請件数5件

### 決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない

区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	1,541				
うち佐賀市の負担額	1,541				

## 2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
市内の道路等を快適で安全に通行できていると感じる市民の割合						%
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
59.9	64.4	64.7	65.0	65.3		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

## 3 事業成果の振り返り

<b>成果目標の達成状況</b>	<b>成果目標の達成状況に対する分析</b>
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



<b>成果目標達成に向けた対応策等</b>
近年、申請件数の増加と整備規模の大型化の傾向にあり、適切な予算規模を確保する。

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	公立認定こども園アクセス道路整備事業		事業期間	令和 2 ~ 令和 4 年度	
担当部署・係名	道路整備課 事業二係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	公立認定こども園に隣接する市道大井樋緑ヶ丘線の車道拡幅 延長L=225m、幅員9.5m（車道7m、歩道2.5m）				
整備の目的	安心・安全な公立認定こども園までのアクセス道路の確保				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	年度	年度
工事請負費					
測量・監理等委託料	4,200				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等	6				
計	4,206				
うち佐賀市の負担	406				
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					4,200
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					6
計					4,206
うち佐賀市の負担					406

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
R2	R3	R4								
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
43.9%	96.6%	100.0%								
7.9%										

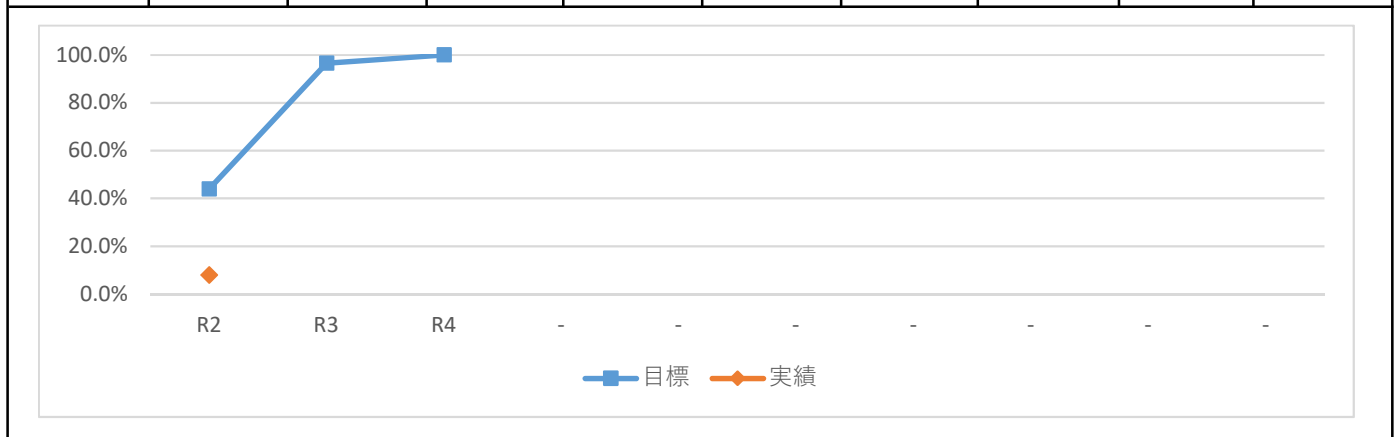

# 令和3年度 事務事業進捗報告シート

事務事業名	交通安全対策事業（道路整備課）	事業期間	～	年度
担当部署・係名	道路整備課 事業一係	担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	09地域で守る生活者の安全確保		
	基本事業	交通安全の推進		

## 1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	交通安全対策特別交付金（交通反則金収入）を財源として、生活道路や通学道路等の危険箇所解消ならびに歩道の改良を行うことにより、児童及び市民が安全に通行できる道路環境を提供する				
事業の対象者	道路利用者				
令和2年度 主な活動実績	令和2年度実績 歩道L = 2,738m、区画線L = 19,504m、防護柵L = 1,006m、車線分離標N = 8本、道路反射鏡N = 75基、道路標識N = 1基				
<b>決算の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業総額	69,896				
うち佐賀市の負担額	7,606				

## 2 成果指標の目標及び実績

成果指標①						単位
市内の道路等を快適で安全に通行できていると感じる市民の割合						%
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		
59.9	64.4	64.7	65	65.3		

成果指標②						単位
R2 実績	R3 目標 実績	R4 目標 実績	R5 目標 実績	R6 目標 実績		

## 3 事業成果の振り返り

成果目標の達成状況	成果目標の達成状況に対する分析
	令和2年度は基準値となるため、令和3年度の実施結果から記載



成果目標達成に向けた対応策等
交通安全施設の整備、拡充を行い、危険個所の減少に努め、道路交通の安全性を確保、向上していく。

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	橋りょう長寿命化事業	事業期間	令和 2 ~ 令和 11 年度
担当部署・係名	道路整備課 事業一係	担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち	
	施策	12道路ネットワークの充実	
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保	

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀市が管理する道路橋の橋りょう長寿命化計画を策定し、計画に基づき定期的に近接目視点検により橋梁の健全度を把握、詳細調査を実施し補修を行う				
整備の目的	道路橋を維持管理し、保全対策を施す				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
工事請負費	34,429				
測量・監理等委託料	18,111				
用地購入費					
補償費					
その他事務費等	2,600				
計	55,140				
うち佐賀市の負担	6,348				
区分	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	合計
工事請負費					34,429
測量・監理等委託料					18,111
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					2,600
計					55,140
うち佐賀市の負担					6,348

2 事業の進捗率

R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	R6	目標 実績	R7	目標 実績	R8	目標 実績	R9	目標 実績	R10	目標 実績	R11	目標 実績
	6.7% 1.3%		11.8%		22.3%		32.5%		44.5%		54.8%		65.1%		75.7%		86.4%		100.0%

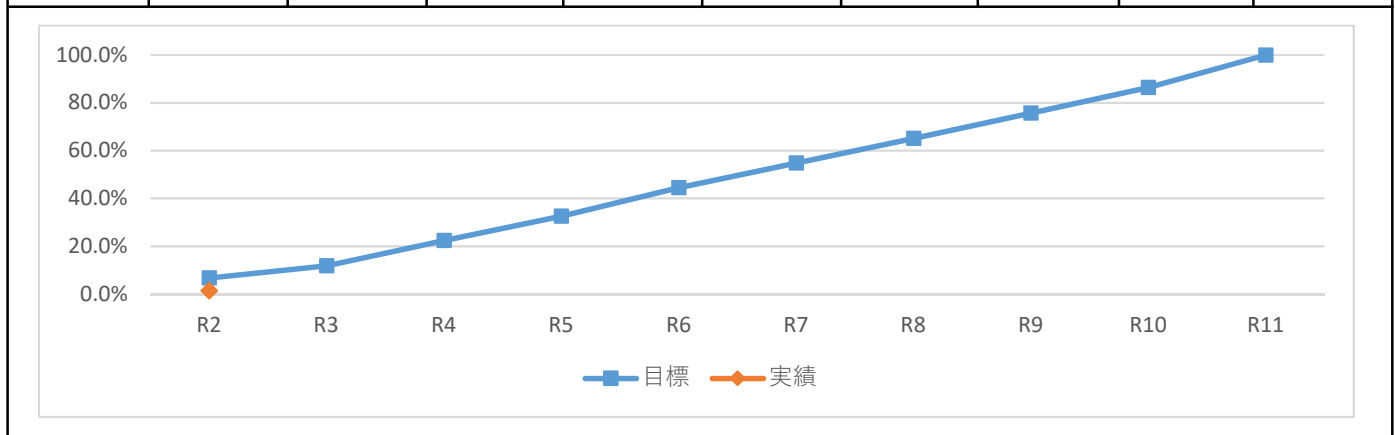

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	八戸天祐線街路整備事業		事業期間	平成 26 ~ 令和 10 年度
担当部署・係名	道路整備課 街路整備係		担当課長名	嘉村 浩二
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	12道路ネットワークの充実		
	基本事業	基幹交通網の整備による円滑な移動の確保		

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀市中心部に位置し、南北の市街地内の区域を結ぶ路線の整備。延長 L = 597m(1工区)、L = 292m(2工区)、L = 135m(3工区)、幅員W = 12m、(車道幅員7.0m、歩道幅員2.5m×2)				
整備の目的	歩行者・自転車の安全確保を行うとともに、通行の円滑化、災害時の避難路、輸送路の確保をはかる。				
事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない					
区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
工事請負費				74,774	89,390
測量・監理等委託料	3,024	17,668	4,910	21,088	43,080
用地購入費		25,140	88,852	8	90,796
補償費				7,002	13,215
その他事務費等					
計	3,024	42,808	93,762	102,872	236,481
うち佐賀市の負担	61	1,738	94	393	16,417
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
工事請負費	149,110	190,846			504,120
測量・監理等委託料	4,777	20,763			115,310
用地購入費	5,281	36,698			246,775
補償費	31,287	154,167			205,671
その他事務費等	3,824	3,784			7,608
計	194,279	406,258			1,079,484
うち佐賀市の負担	4,729	9,389			32,821

2 事業の進捗率

目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
0.5%	2.4%	13.0%	15.5%	32.5%	53.6%	64.0%	69.3%	73.3%	83.4%	
0.2%	2.4%	7.3%	12.7%	25.1%	35.1%	56.3%				

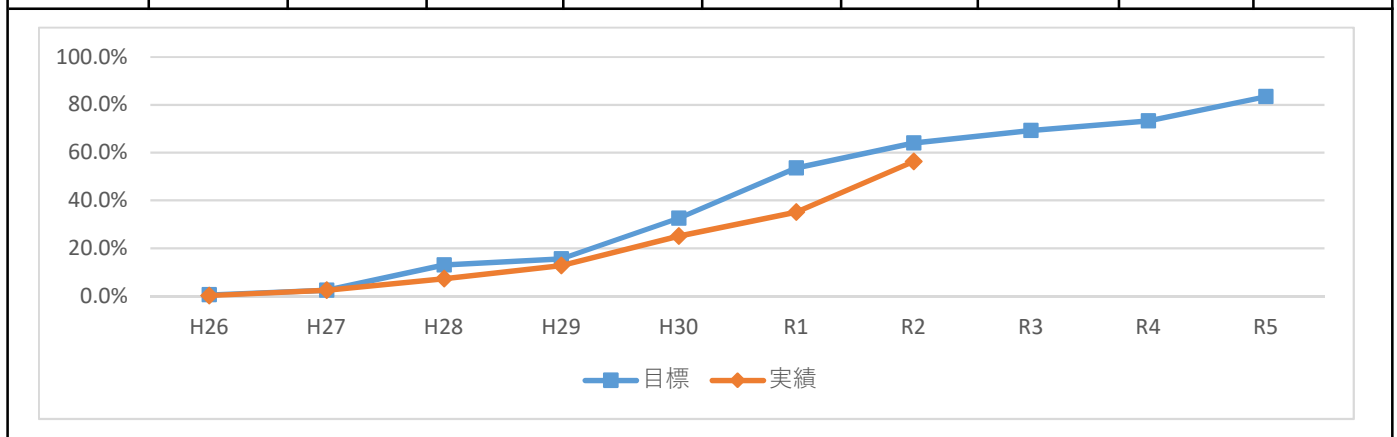

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	東高木木角線街路整備事業		事業期間	令和 1 ~ 令和 7 年度	
担当部署・係名	道路整備課 街路整備係		担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画に おける位置づけ	政策	災害に強く、安心で利便性が高い暮らしが実感できるまち			
	施策	12道路ネットワークの充実			
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保			

1 公共事業の基本情報

整備概要	佐賀市中心部北部に位置する、東西の市街地を結ぶ補助幹線道路であり、小中学校の通学路となる路線の整備。延長L = 265m、幅員W = 12m、(車道幅員7.0m、歩道幅員2.5m×2)				
整備の目的	歩行者・自転車の安全確保を行うとともに、通行の円滑化、佐賀大学医学部への救急搬送時の時間短縮を図り、安全・安心な都市環境を創出する。				
<b>事業費決算 (単位 千円) ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
工事請負費					
測量・監理等委託料		33,616			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	0	33,616			
うち佐賀市の負担		227			
区分	R6年度	R7年度	年度	年度	合計
工事請負費					
測量・監理等委託料					33,616
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					33,616
うち佐賀市の負担					227

2 事業の進捗率

目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標	目標
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7				
実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
6.2%	13.3%	22.4%	34.6%	80.1%	90.5%	100.0%				
0%	7.0%									

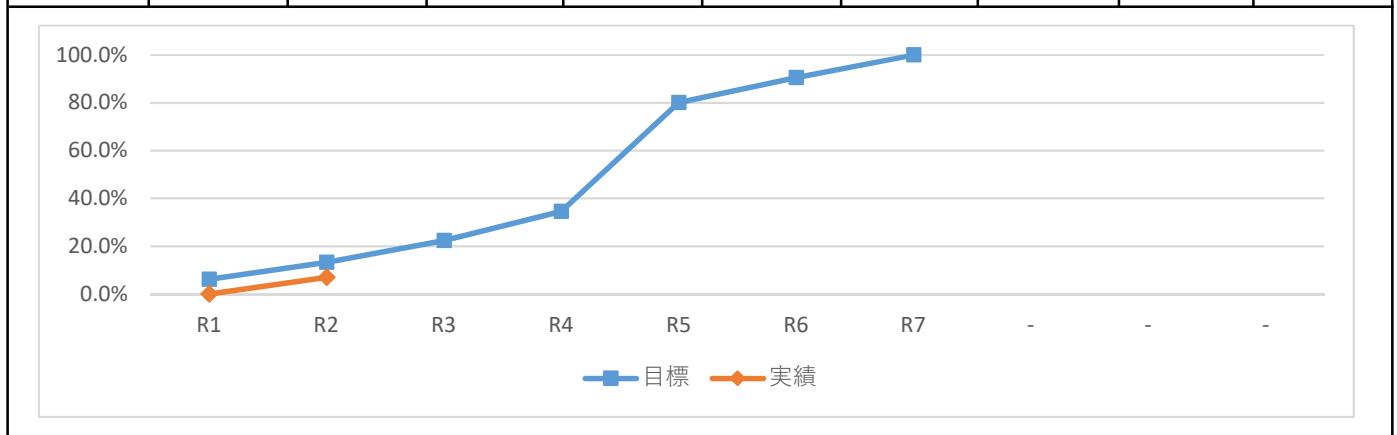

令和3年度 事務事業実績報告シート



事務事業名	県営事業負担金	事業期間	～	年度
担当部署・係名	道路整備課 街路整備係	担当課長名	嘉村 浩二	
総合計画における位置づけ	政策	災害に強く、安心して利便性が高い暮らしが実感できるまち		
	施策	12道路ネットワークの充実		
	基本事業	生活道路の整備による快適で安全な移動の確保		

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	佐賀県が実施する佐賀市内の都市計画道路整備に要する経費の一部を佐賀市が負担する。 城内線（3工区）事業期間：H26～R3 事業内容：延長L = 340m、幅員W = 16m、(車道幅員9.0m、歩道幅員3.5m×2) 城内線（4工区）事業期間：H30～R6 事業内容：延長L = 173m、幅員W = 16m、(車道幅員9.0m、歩道幅員3.5m×2) 神野町八戸溝線（3工区）事業期間：H29～R8 事業内容：延長L = 480m、幅員W = 18m、(車道幅員9.0m、歩道幅員4.5m×2)				
事業の対象者	道路利用者				
根拠法令等	地方財政法27条				
<b>決算額の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない</b>					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
事業費総額	77,732				
うち佐賀市の負担額	7,832				

2 事業の活動実績

活動実績①					単位
城内線（3工区）事業進捗率					%
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	
74					
活動実績②					単位
城内線（4工区）事業進捗率					%
R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	
45					

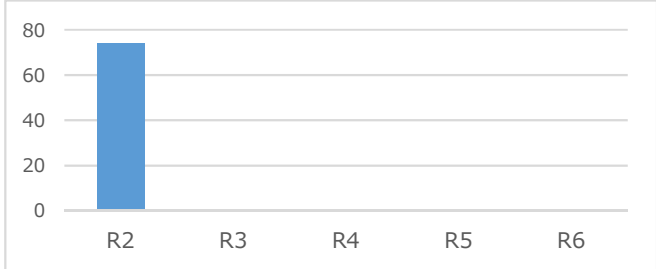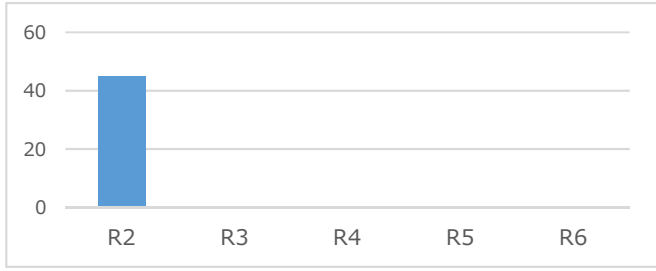3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

現在、都市計画道路城内線外1路線の本工事費と事業期間中の維持管理費および都市計画道路扇町森田線外2路線の街路調査費に対して負担金を拠出している。事業進捗は、事業認可計画に基づいて推移している。現在、施工中の路線は令和8年度までに完了の予定である。また、街路調査を行っている3路線が事業実施となる予定であることから、引き続き、本負担金の拠出が見込まれる。
