


サンライズストリート沿線施設の検討状況

◎交流スペース

- ① 歩道と車道の段差をなくし、フラット化
- ② 休憩できる「日よけ、ベンチ」を整備
- ③ 桜の木の根本にミニ花壇を整備
- ④ 両側に、景観に配慮したフェンスを設置

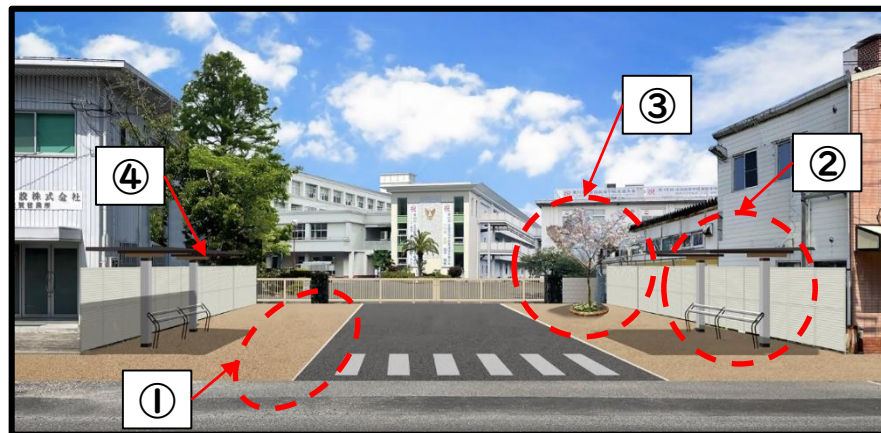

◎交流施設

- 設計・施工業者の選定に係る公募型プロポーザルを実施（6月～8月）
- 設計業務（9月～12月予定）、改修工事（12月～R6.3月予定）




- ◆ 活用事業者（カフェ事業者を想定）募集に係るサウンディング型市場調査の実施（7月～8月）
- ◆ 活用事業者公募（9月～10月）

サンライズストリート沿線施設の検討状況

◎ポケットパーク

- ① キッチンカーが乗入れ可能な舗装
- ② 平坦なくつろぎスペースを設け、人工芝を整備
- ③ 休憩できる「日よけ、植栽、箱型ベンチ」を整備
- ④ 周囲との境に、景観に配慮したフェンスを設置

※ トイレの整備は、衛生的に保つための日常的な維持管理面の課題が大きい。

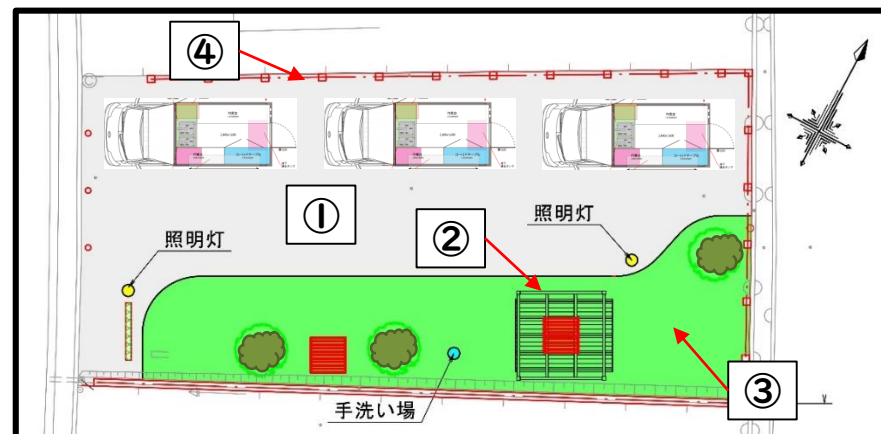サンライズストリート沿線のトイレ対応について

<当面の対応>

- ・交流施設のトイレをフリーに利用できるトイレとして活用
- ・沿線の店舗等に協力していただき「トイレシェアリング」の仕組みを作る。
⇒協力店舗への聞き取りにより、トイレの利用状況を把握する。

【トイレシェアリングの概要】

- ・佐賀大学芸術地域デザイン学部の学生と一緒に推進
- ・店舗等への協力依頼、トイレマップ制作、目印となるステッカー等の制作



ステッカー見本

■整備の状況

整備区間：市道三溝線（駅北通り交差点～血液センター間）

※整備概ね完了（駅北通り交差点～信号交差点（アパホテル前））

整備延長：約900m（概ね完了 約260m）

整備期間：道路東側 令和4年度から令和6年度

道路西側 令和6年度から令和9年度

※整備時期は、工事の進捗状況により変わることがあります。



■フラワーポット (プランター) 案

●一般的なフラワーポット



●ベンチにもなるフラワーポット

