

所属名	事務事業名	ページ番号
佐賀駅周辺整備構想推進室	佐賀駅周辺整備事業	2
佐賀駅周辺整備構想推進室	佐賀駅周辺活性化事業	3

令和3年度 公共事業進捗報告シート


公共事業名	佐賀駅周辺整備事業		事業期間	令和 1 ~ 令和 5 年度
担当部署・係名	佐賀駅周辺整備構想推進室 整備係		担当課長名	西 洋徳
総合計画における位置づけ	政策	地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち		
	施策	03賑わいあふれる中心市街地の活性化		
	基本事業	街なか再生の基盤整備		

1 公共事業の基本情報

整備概要	北口駅前広場の整備、南口駅前広場の整備、市道三溝線沿道におけるポケットパークの整備				
整備の目的	まちの玄関口である佐賀駅周辺の魅力向上を図るとともに、街の南北軸（SAGAサンライズパーク～佐賀駅周辺～中心市街地）を強化し、中心市街地全体の賑わい創出につなげることを目指す。				
事業費決算（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
工事請負費		63,687			
測量・監理等委託料	18,597	43,702			
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計	18,597	107,389			
うち佐賀市の負担	558	4,564			
区分	年度	年度	年度	年度	合計
工事請負費					63,687
測量・監理等委託料					62,299
用地購入費					
補償費					
その他事務費等					
計					125,986
うち佐賀市の負担					5,122

2 事業の進捗率

R1	目標 実績	R2	目標 実績	R3	目標 実績	R4	目標 実績	R5	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績
	6.0% 2.1%		56.0% 14.0%		77.0%		97.0%		100.0%				

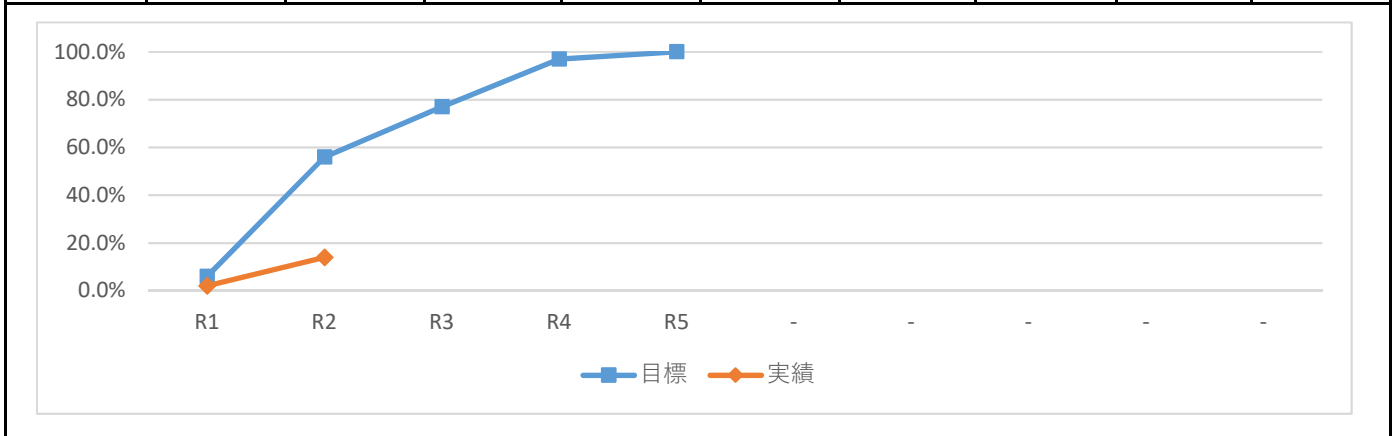

令和3年度 事務事業実績報告シート

事務事業名	佐賀駅周辺活性化事業	事業期間	令和 1 ~ 令和 4 年度
担当部署・係名	佐賀駅周辺整備構想推進室 推進係	担当課長名	西 洋徳
総合計画における位置づけ	政策	地域資源を活かして新たな賑わいと活力を創出するまち	
	施策	03賑わいあふれる中心市街地の活性化	
	基本事業	街なか再生の基盤整備	

1 事務事業の基本情報

事業概要・目的	駅前広場整備に伴う代替駐車場確保等のため、旧西友駐車場敷地を賃借し市営暫定駐車場として運営する。また、駅前の食品スーパーの来店者駐車場としても利用されることで、日常的な買い物等の市民生活の利便性を高めるとともに駅周辺の賑わい創出を図る。 <対象地概要> ・名称／佐賀駅南口暫定駐車場 ・期間／令和元年7月1日～令和4年4月末 ・駐車可能台数／351台（地積 10,113.08㎡）				
事業の対象者	市民・来街者				
根拠法令等	佐賀駅周辺整備基本計画				
決算額の推移（単位 千円） ※職員人件費は含まない					
区分	R2年度	R3年度	R4年度	年度	年度
事業費総額	105,652				
うち佐賀市の負担額	105,652				

2 事業の活動実績

活動実績①					単位
駐車場利用台数					台
R2実績	R3実績	R4実績	実績	実績	
464,865					

活動実績②					単位
駐車場収入					円
R2実績	R3実績	R4実績	実績	実績	
62,116,565					

3 活動実績の推移に関する分析及び今後の見込み

- ・令和2年6月コムボックス佐賀駅前がオープンしたことにより、1日の駐車台数がオープン前と比較して約4倍に増加した。
- ・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、パークアンドライド等の長時間利用が減少したため、駐車場収入は昨年度と比較して約2割減となった。
- ・コロナ感染拡大が収束に向かえば、飲食や旅行需要の回復にともない長時間駐車も増えることから、駐車場収入も徐々に回復すると思われる。
